



التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014

تقديم عام
تقدم الأشغال

الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد، نزل المرادي قمرت، 3 ديسمبر 2013



1. التقديم والأهداف العامة
2. الإطار القانوني والتنظيمي
3. منهجية التعداد
المرحلة التمهيدية
مرحلة العد
استغلال المعطيات
4. الحملة الإعلامية والتحسيسية
5. الموارد البشرية والمادية وميزانية التعداد
6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013
7. التحديات

1. التقديم والأهداف العامة



تقديم عام

- التعداد العام للسكان والسكنى هو المصدر الأساسي لتوفير الإحصاء الرسمي للسكان المقيمين وعدة بيانات على المستوى الجغرافي الدقيق من التقسيم الإداري (الولاية، المعتمدية، العمادة، البلدية والدائرة البلدية).
- يوفر التعداد معطيات إحصائية دقيقة لإرساء العمل التنموي على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.
- شهدت البلاد التونسية منذ 1921 أحد عشر تعدادا أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء أربعة تعدادات خلال السنوات 1975 و 1984 و 1994 و 2004.

1. التقديم والأهداف العامة



عدد السكان بالبلاد التونسية حسب التعدادات

عدد السكان	التاريخ
2.093.939	06 مارس 1921
2.159.708	20 أبريل 1926
2.410.692	22 مارس 1931
2.608.313	12 مارس 1936
3.230.952	01 نوفمبر 1946
3.783.169	01 فيفري 1956
4.533.351	03 ماي 1966
5.588.209	08 ماي 1975
6.966.175	30 مارس 1984
8.785.711	20 أبريل 1994
9.910.872	28 أبريل 2004
?????	أفريل 2014



1. التقديم والأهداف العامة

يمكن التعداد من:


- إحداث قاعدة بيانات لسحب عينات المسوح الأسرية خلال العشرية القادمة
- توفير مؤشرات حديثة وشاملة تتعلق بالمحاور التالية:
- ديموغرافية (التركيبية العمرية للسكان، الحالة المدنية، الانجاب، العزوبة،...)
- تربوية وتكوينية (الأمية، المستوى التعليمي، التمدرس، ...)
- اجتماعية (الهجرة الداخلية و الخارجية، التغطية الاجتماعية والعلاج، الاعاقة،...)
- اقتصادية (النشاط الاقتصادي، التشغيل، البطالة، ...)
- السكن (خصائص العمارات السكانية و المساكن والمحلات، ...)
- الأسر و ظروف عيشها (وسائل النقل، الثقافة، الترفيه، التجهيز المنزلي، تكنولوجيا المعلومات والإتصال)

2. الإطار القانوني والتنظيمي




- انعقاد مجلس وزاري حول التعداد بتاريخ 3 جوان 2013
- إصدار الأمر عدد 2862 لسنة 2013 مؤرخ في 10 جويلية 2013 يتعلق بتنظيم التعداد العام الثاني عشر للسكان والسكنى
- تكليف المعهد الوطني للإحصاء بإنجاز التعداد
- التنصيب على إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية مهمتها الإشراف على عمليات التعداد
- تحديد آجال إنجاز التعداد كالاتي: مرحلة تمهيدية سبتمبر 2013 – مارس 2014 ومرحلة العد الفعلي أبريل – ماي 2014

2. الإطار القانوني والتنظيمي

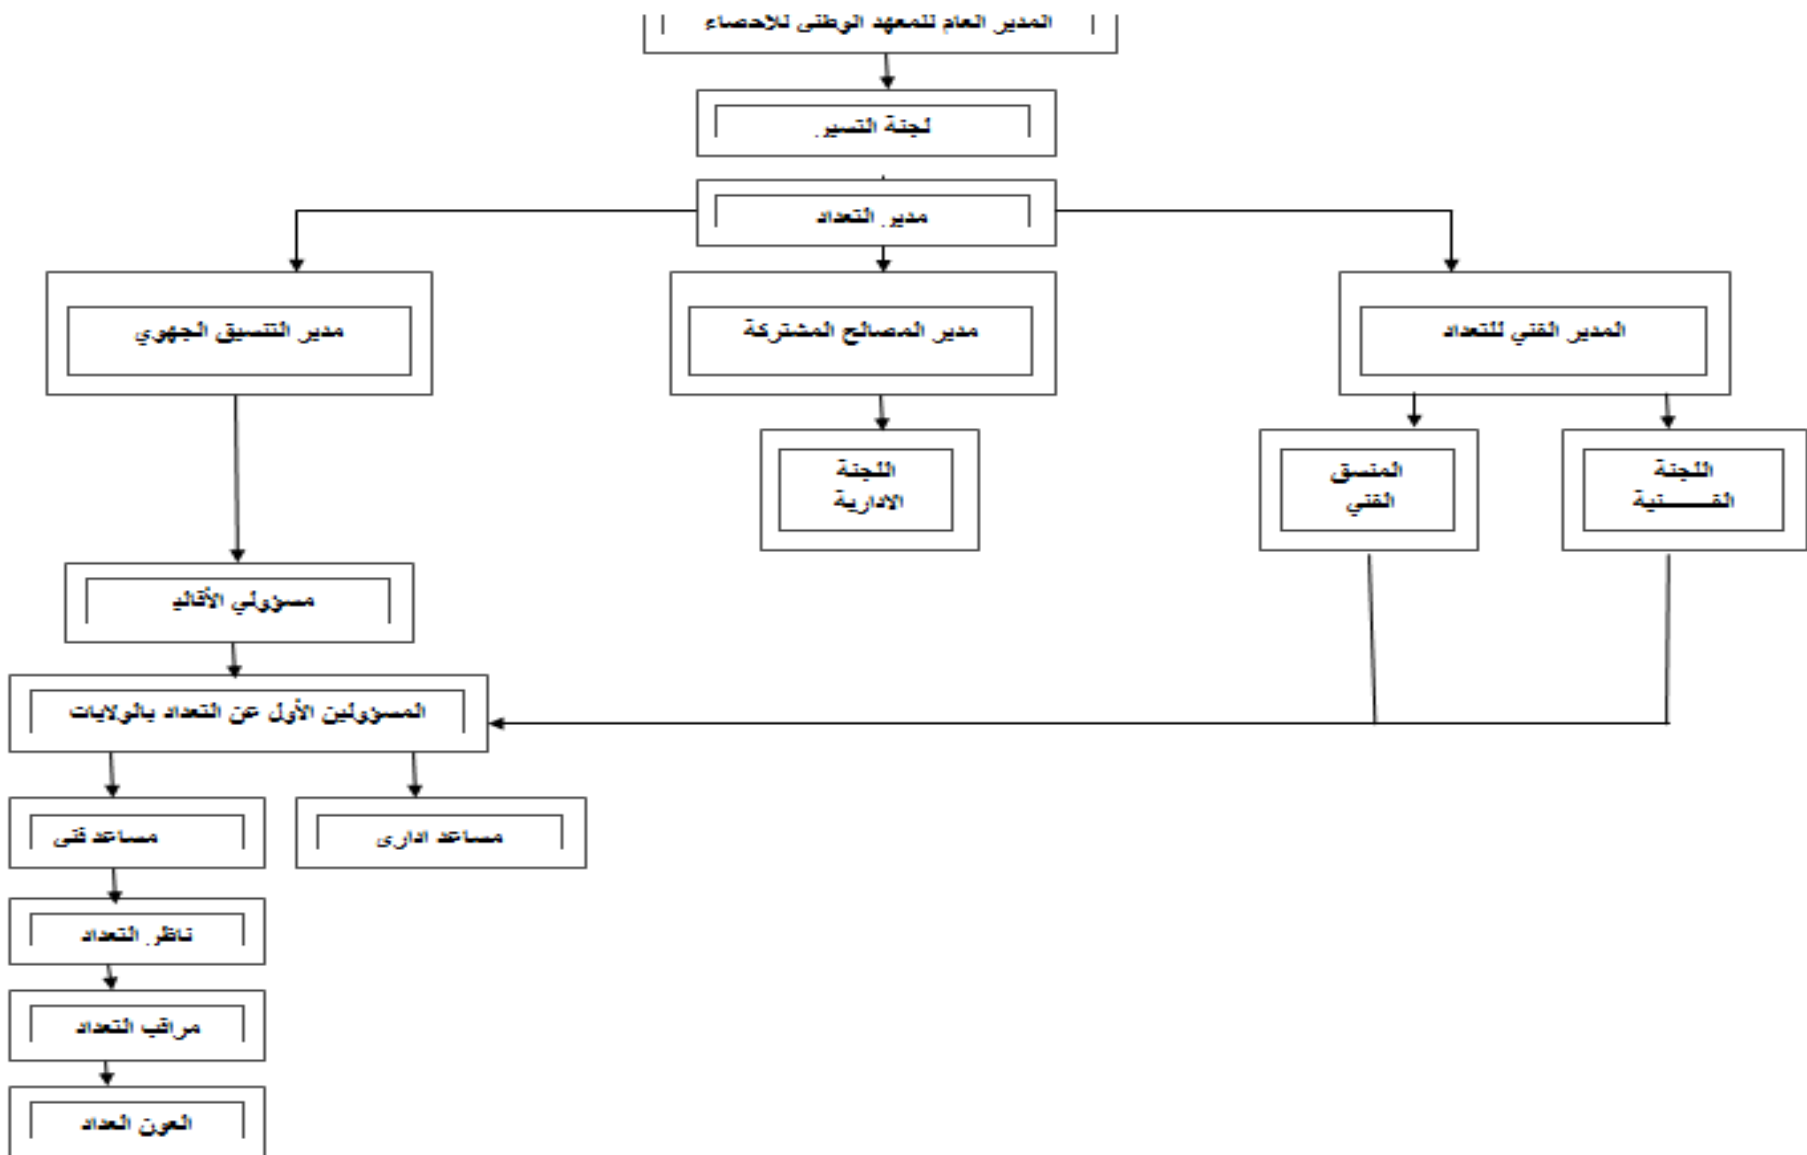

2. الإطار القانوني والتنظيمي

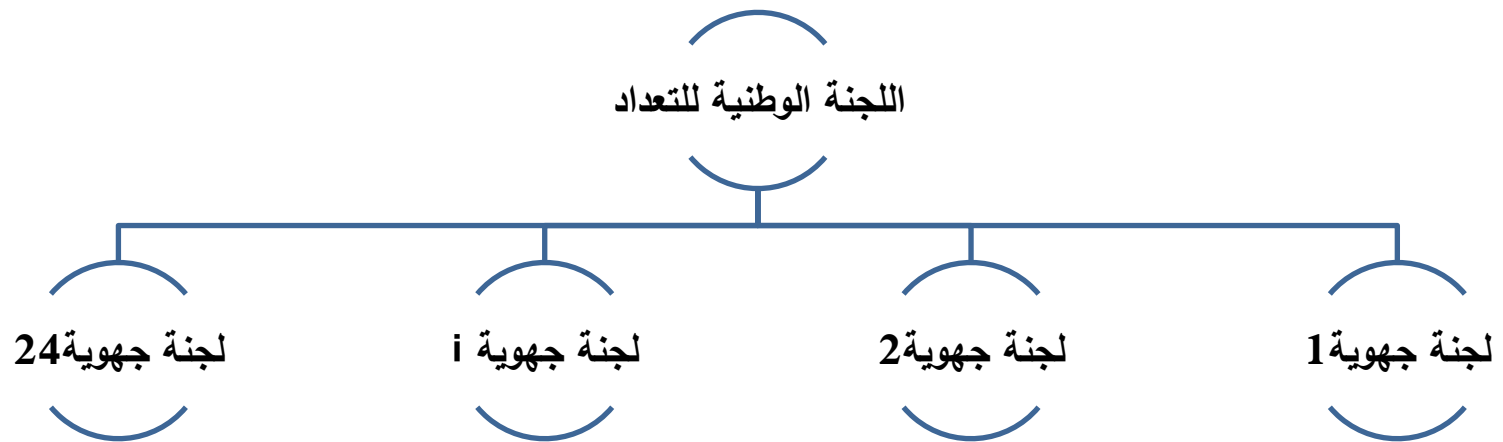

3. منهجية التعداد



✓ يتم إنجاز التعداد حسب المعايير والمناهج المتعارف عليها وطنيا ودوليا وفق برنامج يحتوي على مراحل أساسية تتمثل في :

- المرحلة التمهيدية للتعداد
- مرحلة العدّ
- مرحلة إستغلال المعطيات ونشرها

✓ يقوم المعهد باستعمال نظام المعلومات الجغرافية (SIG) في مختلف مراحل التعداد بتركيز قاعدة بيانات مكانية متطورة واعتماد صور الأقمار الصناعية

المرحلة التمهيدية



الهدف : تجزئة التراب التونسي إلى مناطق عد بمتوسط 70 أسرة لكل واحدة، لضمان شمولية التعداد ولتنظيم عملية العد ميدانيا.

العمل الميداني:

- توفير أمثلة المدن والخرائط الطوبوغرافية للمناطق الريفية.
- رسم الوحدات الإدارية (المعتمدية، العمادة، البلدية،...) على الأمثلة والخرائط.
- تجزئة التراب التونسي إلى وحدات جغرافية وإجراء إحصاء أولي للمحلات والمساكن والأسر بكل وحدة.

مرحلة العدّ



- الاتصال بجميع الأسر المقيمة بالتراب التونسي وجمع بيانات عنها وعن أفرادها وعن المساكن التي تقطنها وذلك باستيفاء استمارات المساكن والأسر والعمارات السكنية
- تدوم فترة العدّ 3 أسابيع انطلاقا من اليوم المرجعي للتعداد
- توفير مكتب محلي للتعداد على مستوى كل دائرة تعداد أو منطقة إشراف
- إنتداب وتكوين قرابة 12.500 عون عداد و قرابة 3430 مراقب على المستوى المحلي مع توفير 2200 سيارة لتسهيل عملية العد

استغلال المعطيات



المرحلة الأولى: استغلال المعطيات الجمالية (جوان - جويلية 2014)

حصر العدد الرسمي للسكان المقيمين بالبلاد التونسية وتوزيعهم حسب الجنس والوحدات الادارية وكذلك عدد المساكن والأسر وتعتمد هذه العملية على المعطيات الجمالية المجمعة.

المرحلة الثانية: استغلال 20% من الاستثمارات (أوت - ديسمبر 2014)

ترميز وخرن واستغلال 20% من الاستثمارات لاستخراج النتائج الأولية حول الخصائص الديمغرافية والتربوية والاقتصادية للسكان وحول المساكن وظروف عيش الأسر على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات.

المرحلة الثالثة : استغلال بقية الاستثمارات (جانفي - ديسمبر 2015)

ترميز وخرن بقية الاستثمارات واستخراج النتائج النهائية للتعداد على مستوى المعتمديات والبلديات.

4. الحملة الإعلامية والتحسيسية



هدف الحملة

اقناع المواطنين بضرورة التفاعل الايجابي مع هذه العملية الوطنية بحسن قبول أعوان التعداد والإدلاء بالمعلومات الصحيحة المطلوبة في الاستمارة.

عناصر الحملة

- إبتكار شعار أو رمز للحملة الإعلامية للتعداد
- إعداد وبث ومضات تلفزيونية وإذاعية حول التعداد
- تغطية صحفية حول التعداد
- استعمال معلقات في صيغ مختلفة توزع بصفة مرحلية حسب رزنامة محددة
- إلخ ...



5. الموارد البشرية والمادية وميزانية التعداد

200 عون ترميز لمدة ثمانية أشهر

27 مسؤول جهوي لمدة سنة

511 عون خزن لمدة ثمانية أشهر

43 مساعد فني لمدة سنة

355 سائقا لمدة ثمانية أشهر

27 مساعد إداري لمدة سنة

12500 عون عد لمدة شهر ونصف

550 ناظر لمدة سنة

2200 سائقا لمدة شهر ونصف

3430 مراقبا لمدة شهر ونصف

- توفير 355 سيارة منها 24 سيارات رباعية الدفع لمدة 8 أشهر
- توفير 2200 سيارة لمدة خمسة أسابيع (في مرحلة العد الفعلي).

ميزانية التعداد



أبواب الميزانية	المبلغ المرصود (مليون دينار)	التوزع النسبي (%)
الأجور	21.4	49.8
التكوين	3.6	8.4
كراء السيارات	13.0	30.2
الندوات والحملة الدعائية	2.0	4.6
نفقات أخرى	3.0	7.0
المجموع	43.0	100.0

تكلفة تعداد الفرد حسب بعض البلدان العربية



البلد	سنة التعداد	تكلفة الفرد (دينار)
الأردن	2014	5.6
المغرب	2014	5.7
تونس	2014	4.0

6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013



جانفي-جوان 2013

- إعداد الملف الفني للتعداد على نطاق الإدارة المركزية.
- إعداد الملف الكارطوغرافي المستخرج من قاعدة نظام المعلومات الجغرافية بالمعهد
- إعداد الأمر الذي يكلف المعهد الوطني للإحصاء بإعداد وإنجاز التعداد.
- على النطاق الجهوي:
 - إقتناء الخرائط والأمثلة: أمثلة البلديات، أمثلة الدشر الأساسية والتثبت من شمولية التغطية في كل ولاية لكل الوحدات الإدارية المنتمية لها.
 - رسم الحدود لكل الوحدات الإدارية والتثبت منها مع المسؤولين على النطاق الجهوي.

6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013



جويلية-أوت 2013

- طباعة كامل الملفات اللازمة لعملية المرحلة التمهيدية:
 - الأمثلة والكراسات
 - دليل الناظر (مثال 11)
 - ملف كارطوغرافي (مثال 11 مكرر)
 - مصنف استعمال المحلات
- التحاق المسؤولين الجهويين بمراكز عملهم بالولايات، تركيز المكاتب الجهوية للتعداد والقيام بالاتصالات مع السلط الجهوية

6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013



12 - 25 أوت 2013

انتداب الأعوان النظار على النطاق المحلي

26 أوت - 6 سبتمبر 2013

تكوين المكونين على المستوى الوطني (المسؤول الأول ومساعديه لكل منطقة إشراف).

9 - 21 سبتمبر 2013

التكوين على المستوى الجهوي للنظار المكلفين بالمرحلة التمهيديّة.

6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013



بداية أكتوبر 2013

تسلم الدفعة الأولى من السيارات المكربة و الـ 24 سيارة رباعية الدفع

7 أكتوبر 2013

إنطلاق العمل الميداني للمرحلة التمهيديّة والتي تتمثل في ضبط حدود المناطق البلدية وبقية التجمعات السكنية والمناطق الترابية على الأمثلة والخرائط ثم على الميدان. ثم يقع مسح كل هذه المناطق وذلك لحصر عدد المحلات والمساكن والعمارات ومباني السكن الجماعي والأسر والأفراد التي تقيم بها

6. تقدم أشغال التعداد إلى موفى نوفمبر 2013



3 ديسمبر 2013

الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد

تقدم الأشغال الميدانية:

تم إلى غاية موفى نوفمبر 2013 إنجاز حوالي 30% من مجموع الأسر المتوقع مسحها

7. التحديات



- التحديات الأمنية في الظروف الحالية
- توفير الموارد لمرحلة العد



شکرا
